IMMERSIO

LE PREMIER DATA CENTER SOUS-MARIN PILOTE EN FRANCE



SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

DURABILITÉ

INNOVATION

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

PROBLÉMATIQUE ET PLAN

LA QUESTION À LAQUELLE NOUS RÉPONDONS

Comment créer de la nouvelle capacité de data center près de Marseille, sans saturer le réseau électrique ni consommer d'eau douce, dans un territoire qui conteste déjà les data centers existants ?

1 LE BESOIN

Contexte, controverse marseillaise, expression du besoin et précédents

2 L'ANALYSE ET LE PROJET

Acteurs, juste besoin, scénarios, site, pilote et calendrier

3 LE CHIFFRAGE ET LA MAÎTRISE

Budget, notre mission, organisation, pilotage, risques et limites

Notre position dans le projet

Trois acteurs, un même objectif : un data center sous-marin pour Marseille



CLIENT · DÉCIDEUR · PAYEUR

L'opérateur du data center

Il définit le besoin, engage les investissements et décide aux jalons M6, M24 et M60.

Un objectif : disposer d'une capacité **de calcul durable et locale à Marseille.**

NOTRE RÔLE · AMOA

Nous, 3 consultants

Nous accompagnons le client dans l'analyse, la décision et le pilotage du projet, sans le financer ni le construire.

Notre valeur ajoutée : une **expertise indépendante** pour sécuriser le projet et maximiser ses chances de succès.

CONSTRUCTEUR · MOE

Un spécialiste offshore

Il est sélectionné par appel d'offres pour concevoir, fabriquer, immerger et mettre en service la capsule.

Un partenaire clé : il **réalise les travaux** selon nos exigences techniques, contractuelles et environnementales.

Un besoin réel en France

Une croissance rapide des besoins de capacité de calcul, dans un contexte de tension sur le réseau et de controverses locales.



Croissance rapide
des besoins de calcul

Tension sur le réseau
de raccordement

Des controverses locales
autour de l'eau et du rejet thermique

LES CHIFFRES CLÉS DU CONTEXTE FRANÇAIS



2%

de la consommation électrique française aujourd'hui

x3

d'ici 2035 selon RTE

18 GW

de demandes de raccordement déjà réservées (mai 2026)

> 88 Md€

d'investissements annoncés dans les data centers au S1 2026 (selon Trendeo)

UNE DEMANDE DE RACCORDEMENT TRÈS CONCENTRÉE



La controverse marseillaise

Des data centers terrestres déjà contestés pour leur consommation d'eau et le rejet d'eau réchauffée en mer.



Consommation d'eau importante

Risque d'accès à une ressource déjà sous tension.

Eau rejetée en mer autour de 27 °C

Sans suivi public, selon les associations locales.

Un mouvement citoyen actif depuis 2024

Une mobilisation locale forte contre de nouveaux data centers terrestres.

Une loi de mai 2026 qui accélère ces projets

Statut de projet d'intérêt national majeur (PINM).

EXPRESSION DU BESOIN

Formuler le besoin avant de choisir une solution

POUR QUI ?

L'opérateur et ses clients, RTE, le territoire marseillais

Répondre aux besoins croissants de traitement et de stockage de données des acteurs publics et privés, tout en apportant des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux au territoire.

SUR QUOI ?

Le refroidissement des serveurs et la charge du réseau électrique

Concevoir une solution innovante qui utilise l'eau de mer pour refroidir les serveurs, limiter la consammation d'énergie et réduire la pression sur le réseau électrique, tout en garantissant la performance et la fiabilité.

DANS QUEL BUT ?

De la capacité de calcul près de Marseille, sans saturer le réseau

Offrir une capacité de calcul locale, durable et compétitive, sans recours à l'eau douce, sans conflit d'usage, en valorisant les ressources marines et en s'intégrant au tissu économique et industriel local.

NOTRE CONCLUSION

Le besoin n'est pas seulement un data center sous-marin, mais une solution globale, à comparer à d'autres, pour répondre aux enjeux techniques, environnementaux et territoriaux.

NOTRE SOLUTION

Un data center sous-marin pilote en France

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Les serveurs sont dans une capsule étanche, posée au fond de la mer.
2. L'eau de mer refroidit la capsule naturellement : pas de climatisation, pas d'eau douce.
3. Deux câbles la relient à terre : l'électricité (réseau RTE) et la fibre (les données).



CE QU'ELLE APPORTE AU BESOIN

Sans eau douce
La mer refroidit.

Sans saturer le réseau
Moins d'électricité dépensée pour refroidir.

Sans conflit local
Pas de bâtiment à terre, un rejet mesurable.

TROIS VÉRIFICATIONS AVANT DE LA RETENIR

- Déjà fait ailleurs ?
- Ce qu'elle apporte vraiment
- Est-ce la meilleure option ?

Les précédents internationaux

Trois expériences pour éclairer notre choix

Microsoft
Projet Natick

2018 – 2024



Technologie
Capsule sous-marine immergée

Résultats
8 fois moins de pannes qu'un site terrestre

Fin du projet
Arrêt en 2024 pour une raison d'exploitation : on ne renouvelle pas les serveurs d'une capsule scellée au rythme de l'IA

Enseignement
Technologie fiable, mais inadaptée aux besoins de calcul intensif en IA

Chine
Centre de Hainan

Depuis 2023



Technologie
Data center sous-marin immergé

Performances annoncées
Efficacité énergétique de 40 à 60 % supérieure à un site terrestre

Statut
Site commercial en exploitation depuis 2023

Enseignement
Preuve de la faisabilité technique et d'un modèle commercial

Portugal
Centre de Sines

Depuis 2021



Technologie
Data center terrestre refroidi par l'eau de l'Atlantique (non immergé)

Atout principal
Refroidissement efficace grâce à l'eau de mer

Statut
Site opérationnel à Sines depuis 2021

Enseignement
Alternative pertinente, mais qui ne supprime pas toutes les contraintes (foncier, acceptabilité locale)

Notre conclusion

Ces trois précédents confirment la faisabilité du sous-marin pour du **calcul classique** et écartent l'option d'un site dédié à l'IA, **plus difficile** à maintenir sous l'eau.

UNE SOLUTION AUX BÉNÉFICES MULTIPLES

Une valeur ajoutée pour l'économie, l'environnement et les territoires.

01 ENVIRONNEMENTAL


Préserver les ressources



- Utilisation de l'eau de mer pour le refroidissement
- Aucun prélèvement sur l'eau douce
- Une empreinte terrestre réduite

02 ÉNERGÉTIQUE

Améliorer l'efficacité



- Un refroidissement naturel et stable
- Une consommation d'énergie maîtrisée
- Une electricité plus décarbonée grâce aux énergies locales renouvelables

03 TECHNIQUE

Renforcer la fiabilité



- Un environnement stable à température constante
- Moins d'usure des équipements
- Une continuité de service renforcée

04 TERRITORIAL

Soutenir le territoire



- Une infrastructure discrète et intégrée dans l'écosystème portuaire
- Une dynamique économique locale
- Des emplois et des compétences pour la région
- Une attractivité renforcée pour Marseille

UNE VALEUR DURABLE POUR TOUS

Un projet qui génère des bénéfices environnementaux, économiques et territoriaux, pour un développement durable et responsable des infrastructures numériques.

Des performances prometteuses à confirmer

Des résultats observés sur des projets existants qui montrent le potentiel de la solution, et des objectifs adaptés au contexte marseillais.



DES RÉFÉRENCES QUI PROUVENT LE POTENTIEL

Des projets internationaus qui démontrent la pertinence de la technologie.

0 litre
d'eau douce consommée pour le refroidissement
Observé sur le projet Natick (Microsoft)

40 à 60 %
d'efficacité énergétique en plus
Annoncé sur le projet de Hainan

8× moins
de pannes observées
Observé sur le projet Natick (Microsoft)

NOS OBJECTIFS POUR MARSEILLE

Des ambitions réalistes, adaptées au contexte local et à l'échelle du pilote.

5 MW
de puissance installée pour le pilote
Dimensionnée selon les besoins régionaux

Réduction significative
de l'empreinte terrestre
Une infrastructure sous-marine qui libère de l'espace en surface

Données à affiner
sur les coûts et les délais
Une évaluation précise réalisée pendant le pilote

À RETENIR

Ces résultats montrent un fort potentiel pour IMMERSIO. Le pilote de Marseille permettra de confirmer ces performances dans notre contexte local et d'en mesurer précisément les bénéfices.

LES ACTEURS DU PROJET

Une mobilisation collective pour un projet structurant

Une collaboration multi-acteurs

Le projet s'appuie sur des partenaires industriels, institutionnels et académiques pour garantir sa réussite.

Des rôles complémentaires

Chaque acteur apporte son expertise sur des volets techniques, réglementaires, environnementaux et économiques.

Un ancrage territorial fort

Une dynamique locale autour d'un projet d'avenir pour la transition énergétique de la façade méditerranéenne.



Partenaires industriels

Conception, fabrication, intégration des systèmes et exploitation.



Institutions et autorités

Accompagnement réglementaire, autorisations et soutien au développement.



Partenaires académiques

Recherche, innovation et suivi environnemental.



Collectivités territoriales

Intégration locale, retombées économiques et aménagement du territoire.




EXEMPLES D'ACTEURS POTENTIELS

RTE · Grand Port Maritime de Marseille · Mairie et Métropole
État (préfecture maritime) · Associations environnementales

CE QUI COMPTE LE PLUS

Nos 6 fonctions comparées deux à deux : leur poids

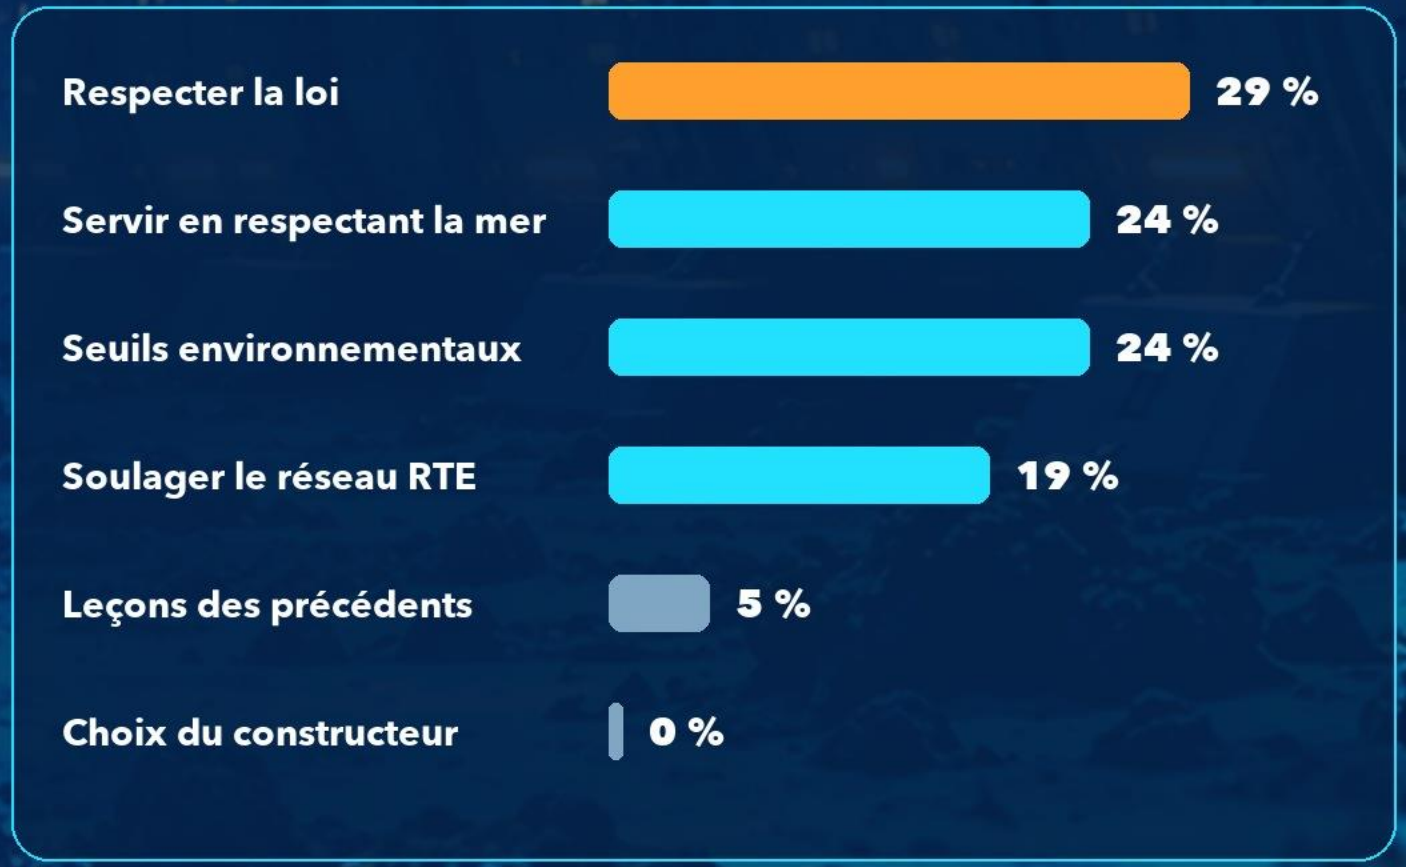

NOTRE RÈGLE

Si le budget dépasse, on réduit d'abord les serveurs. On ne touche jamais au suivi environnemental ni à la conformité.

HIÉRARCHISATION DES BESOINS

Le juste besoin : ce que le pilote retient, reporte et exclut



Retenu pour le pilote

- Une capsule de 5 MW, calcul classique
- Raccordement électrique par RTE
- Autorisations et étude d'impact
- Surveillance et maintenance
- Rejet thermique mesuré et publié
- Concertation locale dès le départ
- Suivi de performance sur 60 mois

Plus tard, si le pilote réussit

- Seconde capsule
- Extension de puissance
- Valorisation de la chaleur
- Jumeau numérique

Exclu du pilote

- Calcul IA haute densité
- Site commercial
- Autres sites hors Marseille

Les quatre scénarios étudiés

Une comparaison multicritère pour un choix justifié

A. Sous-marin à Marseille — Retenu



- ✓ Refroidissement par la mer sans eau douce
- ✓ Raccordement à négocier avec RTE (zone dédiée)
- ✓ Proximité des câbles sous-marins
- ✓ Projet innovant mais contesté
- − Acceptabilité locale à construire

Score pondéré (sur 3) : **2,00**

B. Sous-marin en Bretagne



- ✓ Mer plus froide : meilleur refroidissement
- − Pas de zone dédiée identifiée avec RTE
- − Connectivité plus faible
- − Parc marin d'Iroise, courants forts
- − Aucun précédent administratif

Score pondéré (sur 3) : **1,48**


C. Terrestre à Plan-de-Campagne



- ✓ Raccordement possible (zone d'accueil 500 MW)
- − Refroidissement à l'air ou à l'eau : le problème actuel
- − Conflit d'acceptabilité local qui perdure
- − Nombreux précédents, pas d'avantage distinctif

Score pondéré (sur 3) : **1,91**

D. Ne rien faire



- − Sites existants restent refroidis à l'eau (rejet à ~27 °C)
- − Demande de raccordement en attente (18 GW)
- − Aucune capacité nouvelle près des câbles marseillais
- − Contestation actuelle inchangée

Score pondéré (sur 3) : **1,10**

Notre choix

Le scénario A obtient le **meilleur score global (2,00/3).** Marseille réunit les atouts essentiels (réseau, connectivité, précédent portuaire) et permet de prouver qu'un data center sous-marin peut être réalisé de manière responsable là où il est le plus contesté.

UN SITE STRATÉGIQUE : MARSEILLE ET SA FAÇADE MÉDITERRANÉENNE

- Bassin Est du Grand Port Maritime, hors zones Natura 2000
- Proximité des infrastructures de raccordement
- Une alternative pour réduire la pression sur l'eau et le foncier
- Un écosystème industriel et académique favorable



Une position géostratégique

Une façade méditerranéenne connectée avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Des infrastructures existantes

À proximité des câbles sous-marins et des réseaux électriques à haute capacité.

Un environnement favorable

Des fonds marins à valider par une étude avant le mois 6, sans eau douce consommée.

Un territoire dynamique

Un écosystème industriel, académique et d'innovation reconnu, au service de la transition numérique et énergétique.

NOTRE PROJET PILOTE

Une première capsule de 5 MW, sur le modèle de Hainan

5 MW

Raccordement RTE

Site pressenti :
façade méditerranéenne
près de Marseille

Statut visé : Projet d'Intérêt National Majeur, à obtenir



Un modèle réplicable

Un projet pilote conçu pour être déployé à plus grande échelle en France et sur d'autres sites stratégiques.

Une technologie éprouvée

Des infrastructures immergées qui s'appuient sur un savoir-faire industriel existant et des composants standards.

Un démonstrateur concret

Une première étape pour valider la faisabilité technique, mesurer les performances et préparer le déploiement industriel.

NOTRE PROJET PILOTE

Une première installation pour valider, apprendre et industrialiser

Objectif du projet pilote

Déployer une première installation de 5 MW pour démontrer la faisabilité technique, économique et environnementale de notre solution, et préparer son déploiement à plus grande échelle.

Chiffres clés

- **5 MW** — Puissance installée
- **53,8 M€** — budget total
- **0 – 60 mois** — Durée du projet




Un site pilote stratégique


Littoral méditerranéen

Un site aux conditions représentatives et à fort potentiel de réplication.

- Fonds marins à étudier
- Proximité du réseau RTE
- Enjeux environnementaux locaux

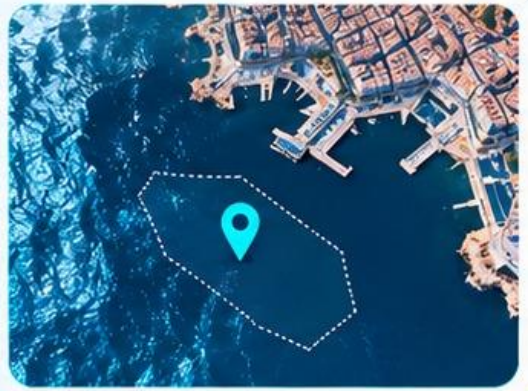

Les principales composantes



Modules sous-marins
5 MW de capacité installée



Raccordement électrique
Connexion au réseau existant



Génie civil et aménagement
Préparation et sécurisation du site



Systèmes de suivi et de contrôle
Surveillance en temps réel des performances et de l'environnement

OBJECTIFS DU PROJET



Ce pilote a un but : prouver qu'un data center sous-marin peut fonctionner de façon fiable et propre à Marseille.

Pour le vérifier, nous nous sommes fixé quatre objectifs, chacun mesurable.

01

FIABILITÉ

Faire mieux qu'un data center terrestre.

≥ 2×
moins de pannes
sur 12 mois

02

ENVIRONNEMENT

Ne pas reproduire la controverse marseillaise.

0
eau douce consommée

Rejet thermique mesuré et publié sous le seuil

03

COÛT

Tenir le budget.

53,8 M€
risques compris

Arrêt si le budget dérape de plus de 30 %.

04

DÉLAI

Mettre le site en service.

36
mois
Site raccordé et opérationnel

CE PILOTE NE FERA PAS


- Pas de calcul IA haute densité
- Pas de seconde capsule
- Pas de déploiement commercial
- Pas de second site

La planification du projet

Quatre phases sur 60 mois, avec trois décisions clés du client

IMMERSIO

DATA CENTER SOUS-MARIN PILOTE
MARSEILLE · 5 MW · 60 MOIS

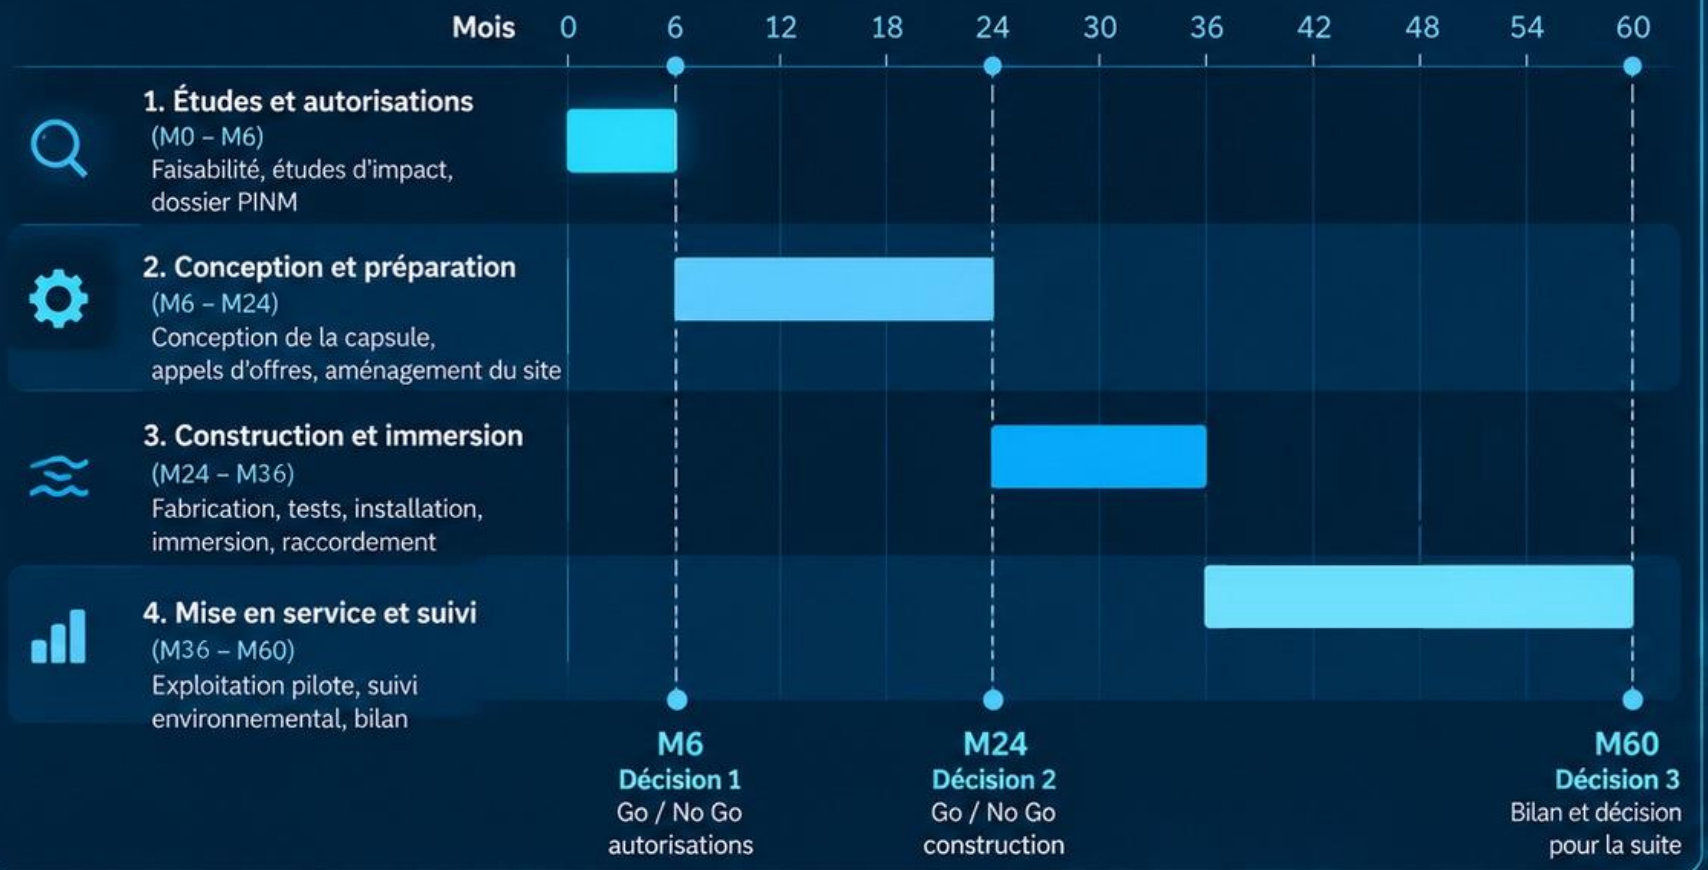

Les trois décisions du client

M6 — Décision 1
Poursuivre si les autorisations sont obtenues et le site validé

M24 — Décision 2
Poursuivre si la conception, les appels d'offres et les tests sont conformes

M60 — Décision 3
Bilan du pilote et décision pour un éventuel déploiement

Le chemin critique

Les autorisations maritimes conditionnent le démarrage de lia construction.

4 mois

de marge avant M24 en cas de retard

L'ordre des tâches

Imposé par le terrain : on teste l'étanchéité avant d'immerger.



MÉTHODE DE CHIFFRAGE

25 tâches, chacune chiffrée en personnes, en jours et en achats

ÉTAPE 1

Le coût de chaque tâche

Coût RH = personnes × jours × coût journalier

Coût financier = achats et sous-traitance

ÉTAPE 2

Le budget hors risque

49,3 M€ : 2,3 M€ de coûts humains et 47,0 M€ d'achats

ÉTAPE 3

Puis risques et rémunération

Provision = probabilité × coût : 4,5 M€. Rémunération ajoutée à part. Total : 53,8 M€

EXEMPLE

Étude de faisabilité : 3 personnes, 25 jours-homme → 7 529 € de RH + 2 700 € d'expert et de documentation

BUDGET DÉTAILLÉ
(HORS RÉMUNÉRATION, HORS RISQUE)


IMMERSIO | DATA CENTER SOUS-MARIN PILOTE
MARSEILLE - 5 MW - 60 MOIS

UN BUDGET MAÎTRISÉ DE 49,33 M€

Une estimation détaillée des coûts des tâches du projet, par poste.

RÉPARTITION DES COÛTS DES TÂCHES

Total : **49 330 831 €**
(hors rémunération, hors risque)

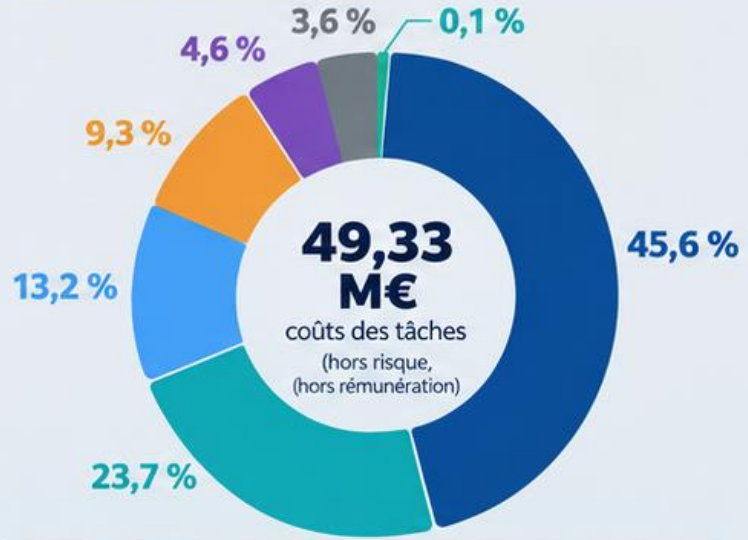

69,3 % du budget sont consacrés à l'équipement informatique et à la capsule.

DÉTAIL PAR POSTE DE COÛT

	**Mission de cadrage (au coût)** Charges, outils, frais de fonctionnement	**30 831 €** (0,1 %)
	**Études et autorisations** Études techniques, réglementaires et démarches administratives	**4 565 000 €** (9,3 %)
	**Raccordement électrique** Câbles sous-marins, raccordement au réseau et postes de conversion	**6 499 000 €** (13,2 %)
	**Capsule** Conception, fabrication, intégration et tests	**11 702 000 €** (23,7 %)
	**Équipement informatique** Serveurs, stockage, réseau et logiciels associés	**22 508 000 €** (45,6 %)
	**Environnement et concertation** Études d'impact, mesures environnementales et dialogue territorial	**2 270 000 €** (4,6 %)
	**Exploitation et pilotage** Outils de supervision, maintenance du pilote et assistance à l'exploitation	**1 756 000 €** (3,6 %)

À RETENIR

- Un budget de **49,33 M€** pour la réalisation des tâches du projet.
- L'équipement informatique et la capsule représentent **69,3 %** des coûts.
- Les risques du projet (**4,49 M€**) et la rémunération de notre équipe (**18 159 €**) ne sont pas inclus dans ce budget.

UNE ESTIMATION FIABLE


Un chiffrage construit sur une analyse détaillée des besoins, des solutions techniques et des conditions de mise en œuvre.

UNE RÉMUNÉRATION CLAIRE ET DES RISQUES MAÎTRISÉS

Un forfait de 51 000 € HT, construit de manière transparente, avec une provision pour risques adaptée aux incertitudes de la mission.

CONSTRUCTION DU FORFAIT AMOA

Un forfait global de **51 000 € HT** pour notre mission de conseil.

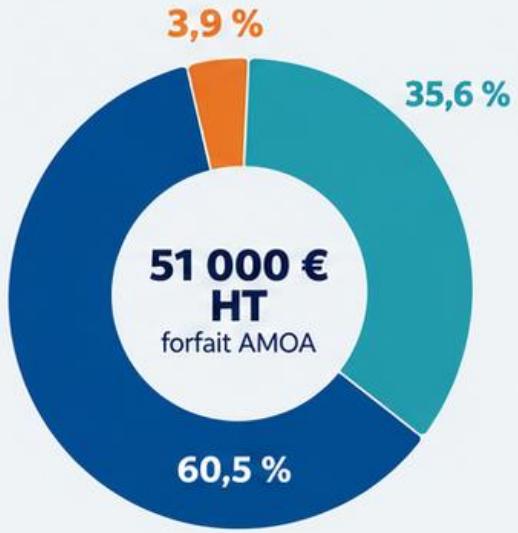

30 831 €
Coût de la mission
(salaires des 3 consultants + frais de mission)
60,5 %

2 010 €
Provision pour risques de notre mission
3,9 %

18 159 €
Rémunération du cabinet
(marge, salaires non compris)
35,6 %

L'ÉQUIPE DE NOTRE MISSION

3 consultants à temps partiel, mobilisés sur 6 mois.

Consultant senior
Pilotage global, coordination et relation client

Consultant confirmé
Suivi technique, appui aux décisions et reporting

Consultant junior
Analyse, préparation des livrables et soutien opérationnel

Senior 25 j - Confirmé 30 j - Junior 25 j = 80 jours-homme
Salaires inclus dans le coût de la mission (30 831 €)

PROVISION POUR RISQUES DE NOTRE MISSION

Une provision limitée et proportionnée aux incertitudes identifiées.

2 010 €
Provision pour risques
3,9 % du forfait

Principaux risques couverts
- Évolution du périmètre de la mission
- Sollicitations supplémentaires du client
- Ajustements du planning

MODALITÉS DE PAIEMENT

15 %
7 650 €
Au lancement du projet

45 %
22 950 €
À mi-parcours (3 mois)

40 %
20 400 €
À la livraison (6 mois)

UNE RÉMUNÉRATION JUSTIFIÉE

Une rémunération en cohérence avec l'expertise mobilisée, la durée de la mission et la valeur apportée au projet IMMERSIO.

ORGANISATION ET RÔLES

Des rôles clairs et une seule autorité par activité

NOTRE MISSION · MOIS 0 À 6

Chef de mission : pilote, relation client et RTE, arbitrages

Consultant confirmé : réglementaire, chiffrage, comités

Consultant junior : recherche, matrices, livrables

LE PROJET · MOIS 6 À 60

Une équipe projet dédiée de l'opérateur, à temps plein, coordonne tous les acteurs au quotidien

QUI RÉALISE, QUI VALIDE

Le constructeur conçoit et construit, l'opérateur valide

RTE réalise le raccordement


Associations et scientifiques assurent le suivi environnemental

DES RISQUES IDENTIFIÉS ET MAÎTRISÉS

Une approche proactive pour limiter les incertitudes et garantir la maîtrise du budget, des délais et des objectifs du projet.

PROVISION POUR RISQUES DU PROJET

Une enveloppe de **4,49 M€** pour couvrir les aléas identifiés.

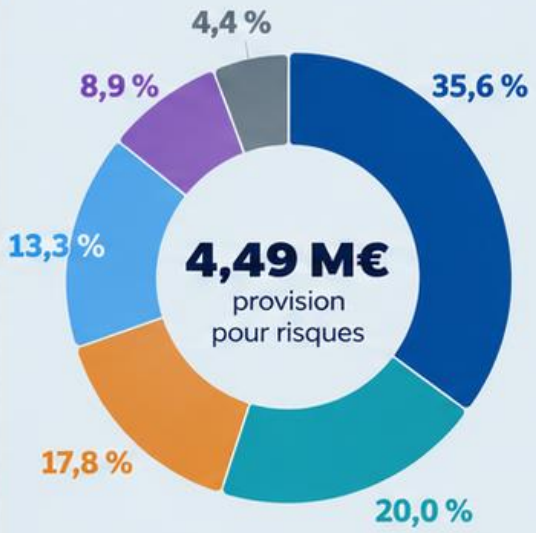

- **1 600 000 €** — **Risques techniques** (fabrication, intégration, performance)
- **900 000 €** — **Risques environnementaux** (impacts, autorisations, retard)
- **800 000 €** — **Risques de planning** (délais, coordination, dépendances)
- **600 000 €** — **Risques réglementaires** (évolutions, conformité)
- **400 000 €** — **Risques financiers** (hausse des coûts, inflation)
- **190 000 €** — **Autres risques** (qualité, partenaires, imprévus)

PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS

Catégorie de risque	Exemple d'aléas	Impact potentiel	Mesures de maîtrise
Technique	Défaillance d'un équipement sous-marin	Élevé	Tests, redondance, maintenance préventive
Environnemental	Impact sur l'écosystème marin	Élevé	Études d'impact, suivi environnemental, dialogue avec les parties prenantes
Planning	Retard de fabrication ou d'installation	Moyen à élevé	Planification détaillée, jalons de contrôle, marges
Réglementaire	Évolution des exigences d'autorisation	Moyen	Veille réglementaire, accompagnement juridique
Financier	Hausse des coûts des matériaux	Moyen	Contrats cadres, clauses de révision
Partenaires	Retard d'un fournisseur clé	Moyen	Sélection rigoureuse, plans de continuité

À RETENIR

- Une provision pour risques de **4,49 M€**, soit **9,1 % du budget** total.
- Des aléas principalement techniques et environnementaux (**55,6 %**).
- Des mesures de maîtrise intégrées dès la phase de conception.

UN PROJET MAÎTRISÉ

Une gestion proactive des risques pour sécuriser les coûts, les délais et la performance du data center sous-marin IMMERSIO.

UN PROJET SOLIDE, DES PERSPECTIVES DURABLES

Un data center sous-marin innovant, au service de la performance et de la transition énergétique, avec des limites identifiées et des perspectives encourageantes.

LES LIMITES IDENTIFIÉES

Des points de vigilance à surveiller tout au long du projet.

Incertitudes techniques
Technologie innovante encore peu déployée à grande échelle, nécessitant des tests et des retours d'expérience.

Enjeux environnementaux
Impacts sur l'écosystème marin à surveiller et à limiter, avec un dialogue continu avec les parties prenantes.

Sensibilité aux coûts
Dépendance aux prix des matériaux, des équipements et aux aléas du marché.

Contraintes réglementaires
Autorisations administratives et environnementales complexes, pouvant générer des délais.

LES POINTS CLÉS DE RÉUSSITE

Des atouts pour un projet viable et porteur de valeur.

Un besoin stratégique
Répondre à la demande croissante de capacité de calcul dans un contexte de sobriété énergétique.

Une solution innovante et durable
Valorisation du refroidissement naturel de l'eau de mer et réduction de l'empreinte carbone.

Un montage maîtrisé
Un budget détaillé, une gestion des risques et un pilotage rigoureux sur 60 mois.

Une forte valeur pour le territoire
Attractivité économique, création d'emplois et positionnement de Marseille comme territoire d'innovation.

LES PERSPECTIVES

Des opportunités à plus long terme.



Un modèle réplicable
Vers de futurs data centers sous-marins de plus grande capacité, en France et à l'international.



Des synergies possibles
Avec la recherche, l'économie bleue et la valorisation de la chaleur pour d'autres usages (réseaux urbains, aquaculture, etc.).



Une contribution durable
À la transition numérique et écologique, en cohérence avec les objectifs de la métropole et de la France.

CONCLUSION

Le projet IMMERSIO est une solution **innovante, réaliste et maîtrisée,** qui répond à des enjeux stratégiques tout en intégrant les risques et les limites identifiés. Il constitue une première étape vers un modèle **durable et réplicable** de data center sous-marin.

UN AVENIR À CONSTRUIRE

Poursuivre les études, sécuriser les autorisations et préparer les prochaines étapes pour amplifier l'impact du projet.

DES DATA CENTERS SOUS-MARINS

Une infrastructure durable au service des territoires



Merci

Pour votre attention

- Un projet durable
- Une valeur économique
- Des territoires renforcés
- Un avenir connecté
